


○平成29年10月22日～23日の台風21号により、宇陀川左岸11.2k付近において河岸侵食を確認。
緊急復旧工事を24時間体制で実施。

<10月25日>

- ・09時50分 木津川上流河川事務所から近畿地方整備局 河川工事課に河岸侵食の一報
- ・11時50分 河川工事課→国土交通省治水課に河岸侵食の一報
- ・12時30分 侵食が拡大し、県道が通行止め(全面通行止め)
- ・14時40分 維持工事受注者に緊急工事施工の要請(指示)
- ・15時00分 緊急復旧工事に着手(袋詰め玉石の運搬準備に着手)
- ・16時50分 照明車・ku-SAT基地出発
- ・17時00分 緊急復旧工事着手の記者発表
- ・17時40分 照明車・ku-SAT現地到着
- ・18時00分 歩道取壊し開始
- ・19時10分 袋詰め玉石搬入開始



10/26 7:40~13:00 室生ダムが放流量低減操作

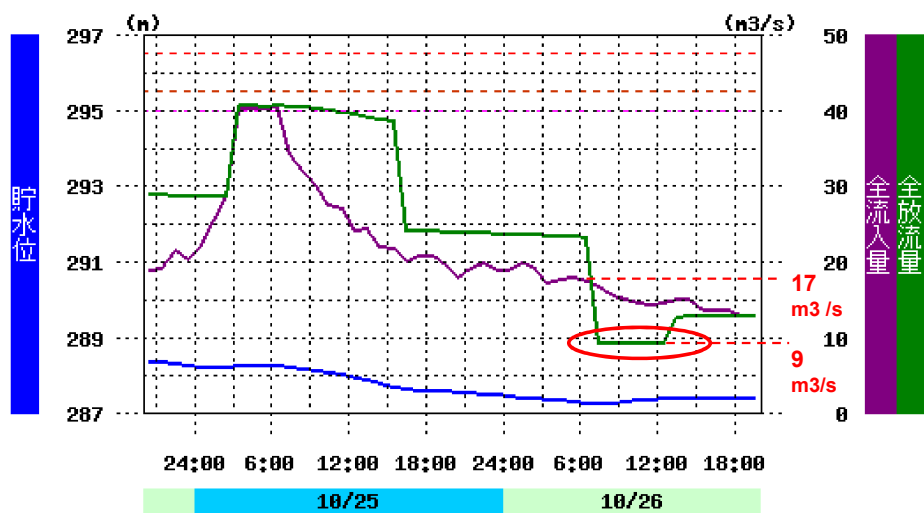

室生ダムへの流入量 **17m3/s** → 室生ダムからの放流量 **9m3/s**

<10月26日>

- ・07時00分 安全かつ確実な施工のため、室生ダムに放流量の低減操作を要請
- ・07時40分～13時00分 室生ダムが放流量の低減操作を実施

<10月27日>

- ・09時00分 緊急復旧工事完了
緊急復旧工事完了の記者発表
- ・09時30分 奈良県宇陀土木事務所 現地安全確認
- ・10時00分 県道通行止め解除

10/26 9:00頃袋詰め玉石据付中



10/26 19:00頃 夜間施工中



10/27 10:00頃 復旧完了(県道通行止め解除)



県道
